COMMUNE D'ETOY

Collège Les Communaux, Etape 2

Boubaker Ingénieurs Conseils SA
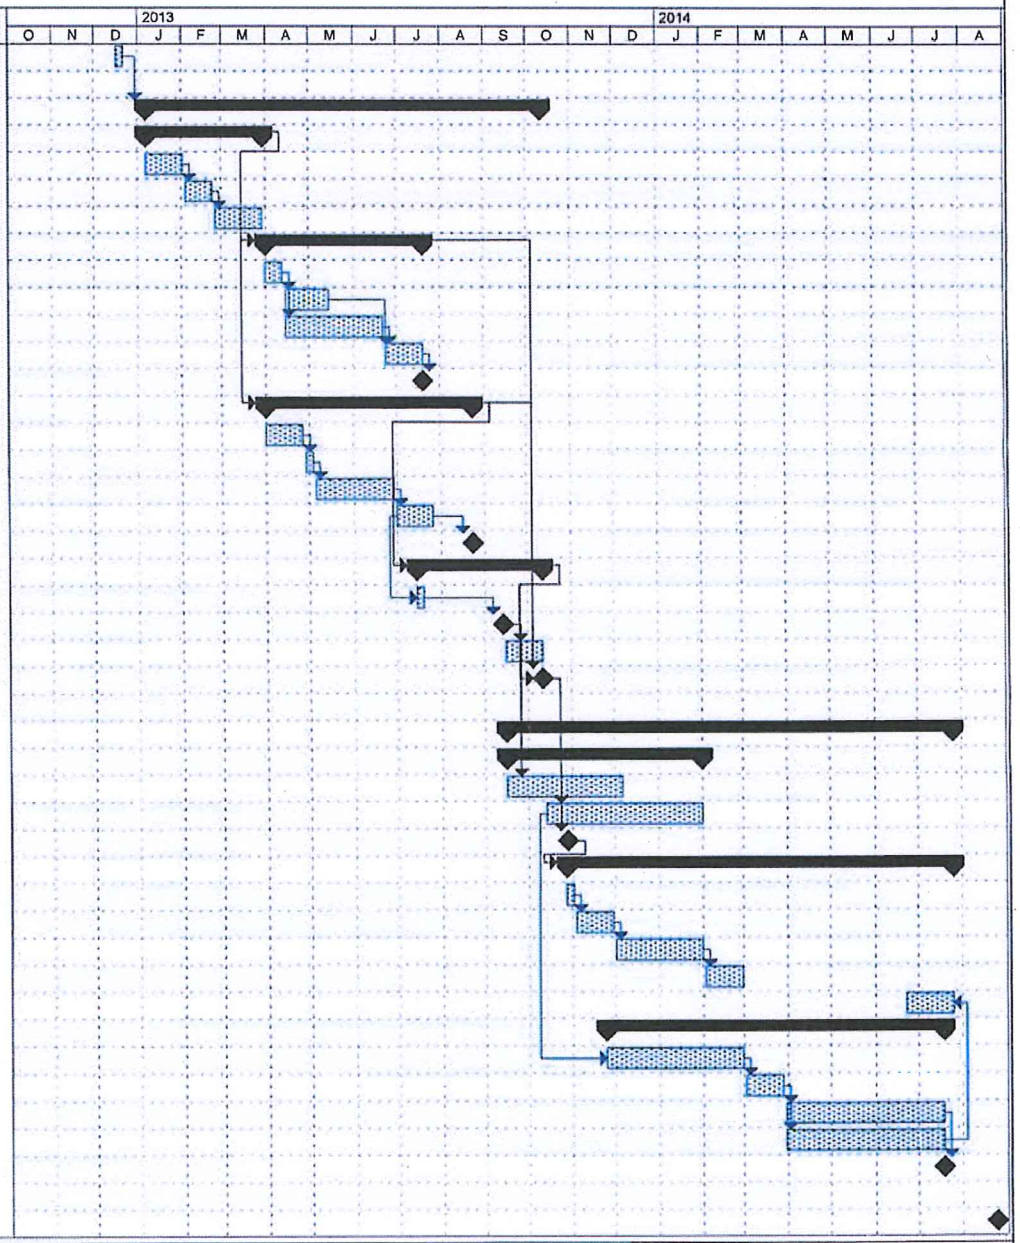
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1	Attribution des mandats d'études	5 jours	Lun 17.12.12	Ven 21.12.12	
2					
3	**ETUDE DU PROJET**	**200 jours**	**Lun 07.01.13**	**Ven 11.10.13**	**1FD+10 jours**
4	**Avant projet et Projet de l'ouvrage**	**60 jours**	**Lun 07.01.13**	**Ven 29.03.13**	
5	Avant projet	20 jours	Lun 07.01.13	Ven 01.02.13	
6	Approbation	15 jours	Lun 04.02.13	Ven 22.02.13	5
7	Projet de l'ouvrage	25 jours	Lun 25.02.13	Ven 29.03.13	6
8	**Autorisation de construire**	**80 jours**	**Lun 01.04.13**	**Ven 19.07.13**	**4**
9	Préparation du dossier	10 jours	Lun 01.04.13	Ven 12.04.13	
10	Enquête publique	22 jours	Lun 15.04.13	Mar 14.05.13	9
11	Traitement du dossier	50 jours	Lun 15.04.13	Ven 21.06.13	9
12	Délais de recours	20 jours	Lun 24.06.13	Ven 19.07.13	11;10
13	Permis en force	0 jour	Ven 19.07.13	Ven 19.07.13	12
14	**Appel d'offres (MP, procédure ouverte)**	**105 jours**	**Lun 01.04.13**	**Ven 23.08.13**	**4**
15	Elaboration des documents	20 jours	Lun 01.04.13	Ven 26.04.13	
16	Publication	5 jours	Lun 29.04.13	Ven 03.05.13	15
17	Calculation des offres	40 jours	Lun 06.05.13	Ven 28.06.13	16
18	Analyse et proposition d'adjudication	20 jours	Lun 01.07.13	Ven 26.07.13	17
19	Adjudication en force, sous réserve décision CC	0 jour	Ven 23.08.13	Ven 23.08.13	18FD+20 jours
20	**Obtention du crédit de construction**	**65 jours**	**Lun 15.07.13**	**Ven 11.10.13**	**14FD-30 jours**
21	Préparation préavis au CC	5 jours	Lun 15.07.13	Ven 19.07.13	18DD+10 jours
22	Décision du CC	0 jour	Ven 13.09.13	Ven 13.09.13	21FD+40 jours
23	Délais référendaire communal	20 jours	Lun 16.09.13	Ven 11.10.13	22
24	**Adjudication des travaux confirmée**	0 jour	Ven 11.10.13	Ven 11.10.13	20;8;14
25					
26	**PHASE DE L'EXECUTION**	**225 jours**	**Lun 16.09.13**	**Ven 25.07.14**	
27	**Préparation**	**100 jours**	**Lun 16.09.13**	**Ven 31.01.14**	
28	Plans d'exécution ingénieur civil	60 jours	Lun 16.09.13	Ven 06.12.13	22
29	Plan d'exécution EG	80 jours	Lun 14.10.13	Ven 31.01.14	24
30	**Ouverture du chantier**	0 jour	Lun 28.10.13	Lun 28.10.13	24FD+11 jours
31	**Travaux de GC et BA**	**195 jours**	**Lun 28.10.13**	**Ven 25.07.14**	**30FD-1 jour**
32	Abattages	5 jours	Lun 28.10.13	Ven 01.11.13	
33	Terrassement, Canalisations	20 jours	Lun 04.11.13	Ven 29.11.13	32
34	Radier	45 jours	Lun 02.12.13	Ven 31.01.14	33
35	Aménagements extérieurs 1	20 jours	Lun 03.02.14	Ven 28.02.14	34
36	Aménagemenet extérieur 2	25 jours	Lun 23.06.14	Ven 25.07.14	41FF+5 jours
37	**Travaux EG**	**170 jours**	**Lun 25.11.13**	**Ven 18.07.14**	
38	Préfabrication	70 jours	Lun 25.11.13	Ven 28.02.14	29DD+30 jours
39	Montage	20 jours	Lun 03.03.14	Ven 28.03.14	38
40	Installations techniques	80 jours	Lun 31.03.14	Ven 18.07.14	39
41	Finitions	80 jours	Lun 31.03.14	Ven 18.07.14	39
42	**Livraison du bâtiment**	0 jour	Ven 18.07.14	Ven 18.07.14	40;41
43					
44	**Rentrée scolaire**	0 jour	Lun 25.08.14	Lun 25.08.14
